



Ansøgningsskema til supplerings af gydebanker

Ansøgers oplysninger

Navn	Karup Å Sammenslutningen v. Ivan Andersen		
Adresse	[REDACTED]		
Navn på evt. projektansvarlig	Ivan Andersen		
Telefon	[REDACTED]	E-mail	ivanandersen2@gmail.com

Beskrivelse af projekt:

Formål	Karup Å Sammenslutningen vil gerne medvirke til at forbedre forholdene for flora og fauna i hele Karup Å-systemet herunder gyde forholdene for bækkens ørreder. Vi ønsker derfor at supplere 10 gydebanker i Trevad Møllebæk med det formål at øge antallet af gyde- og opvækstområder for havørreder i vandløbet. Vi ønsker dermed at øge den fysiske variationer i vandløbet til gavn for insekter, der udgør en del af fødegrundlaget for havørred. Gydebankerne vil hver især blive suppleret med 1 m³ grus af følgende blanding 85% valnøddesten (16-32mm) og 15% singles og håndsten (32-80mm). Vi ønsker tillige at udlægge skjulesten i tilknytning til gydebanken lidt opstrøms for at lave turbulens og modvirke tilsanding og især nedstrøms til gavn for skjulesteder for ynglen. Vi følger anbefalingerne fra DTU's vejledning vedrørende gruset sammensætning. Vejledningen findes på www.fiskepleje.dk. Vi forventer en maksimal opstuvning på 5 cm lige ved gydebankens start. Vi sikrer ved aflæsning af stok med markering, at der 20 m opstrøms første gydebanke ikke kan registreres en ændring i vandstanden. Vi ønsker at lægge gruset ud i hele åens bredde for at forhindre bækken i at arbejde uden om den enkelte gydebanke de første år. Vi forventer en gennemsnitlig dybde over gydebanken på 0,3 m. Ligeledes for at skabe skjul for yngel og fødeemner i form af vanddyr og insekter vil vi i forbindelsen med gydebanker om nødvendigt udplante vandplanter, som naturligt forekommer i åen og i behersket grad udlægge stykker af træ (ikke pil) og fastgjorte små grene dels for at skabe varierede strømforhold og dels som skjul for yngel.		
Vandløbsnavn	Trevad Møllebæk	Mængde af grus i m ³ (Bemærk: sammensætningen af gruset skal følge gældende vejledning fra DTU.)	10 m ³ grus + 5 m ³ sten

Tekniske detaljer:

Antal gydebanker	10
Tykkelse af gruslag (cm)	25-30
Længde af gydebanker (m)	3-5
Anlægges gydebanken i vandløbet fulde bredde?	ja



Denne ansøgning skal vedlægges et kort med indtegnning af gydebankernes placering.

Berørte lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikelnr. og ejerlav	Telefon nr.	E-mail:
██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████	4k, Vridsted By, Vridsted 10d, Vridsted By, Vridsted	██████████	
██████ ██████	██████████ ██████████	6x, Vridsted By, Vridsted	██████████	

Denne ansøgning skal vedlægges en underskrevet partserklæring fra hver berørt lodsejer.

Beskrivelse af adgangsvej og placering af evt. arbejdspladser:

Hvis ikke gruset kan køres direkte til bækken, så vil det lægges i depot på LFSO's parkeringsplads

Adgangsveje og evt. arbejdspladser til opmagasinering af grus kan med fordel indtegnes på det kort i vedlægges.

Beskrivelse af omfanget af maskinkørsel ved udlægning af gydebanke:

Gruset køres med maskine på matrikel 4k, Vridsted By, Vridsted (nord for bækken) og evt. med trillebør det sidste stykke til bækken

Økonomiske forhold:

Prisoverslag	Udgifterne til grus og sten anslås til 8000kr. Udkørsel til 2000kr. I alt ca.10000kr
Afholdes af	Udgifterne dækkes Karup Å Sammenslutningen

Forventet tidsplan:

Start: (måned / år)	August 2025
Slut: (måned / år)	September 2025




Øvrige bemærkninger til projekt, vandløb m.v.


Vedlagte bilag

Oversigtskort med indtegnning af gydebankens placering og evt. adgangsveje og arbejdspladser.	Sæt kryds: x
Antal vedlagte partserklæringer:	Antal: 2


Oversigtskort over projektområde i Trevad Møllebæk:

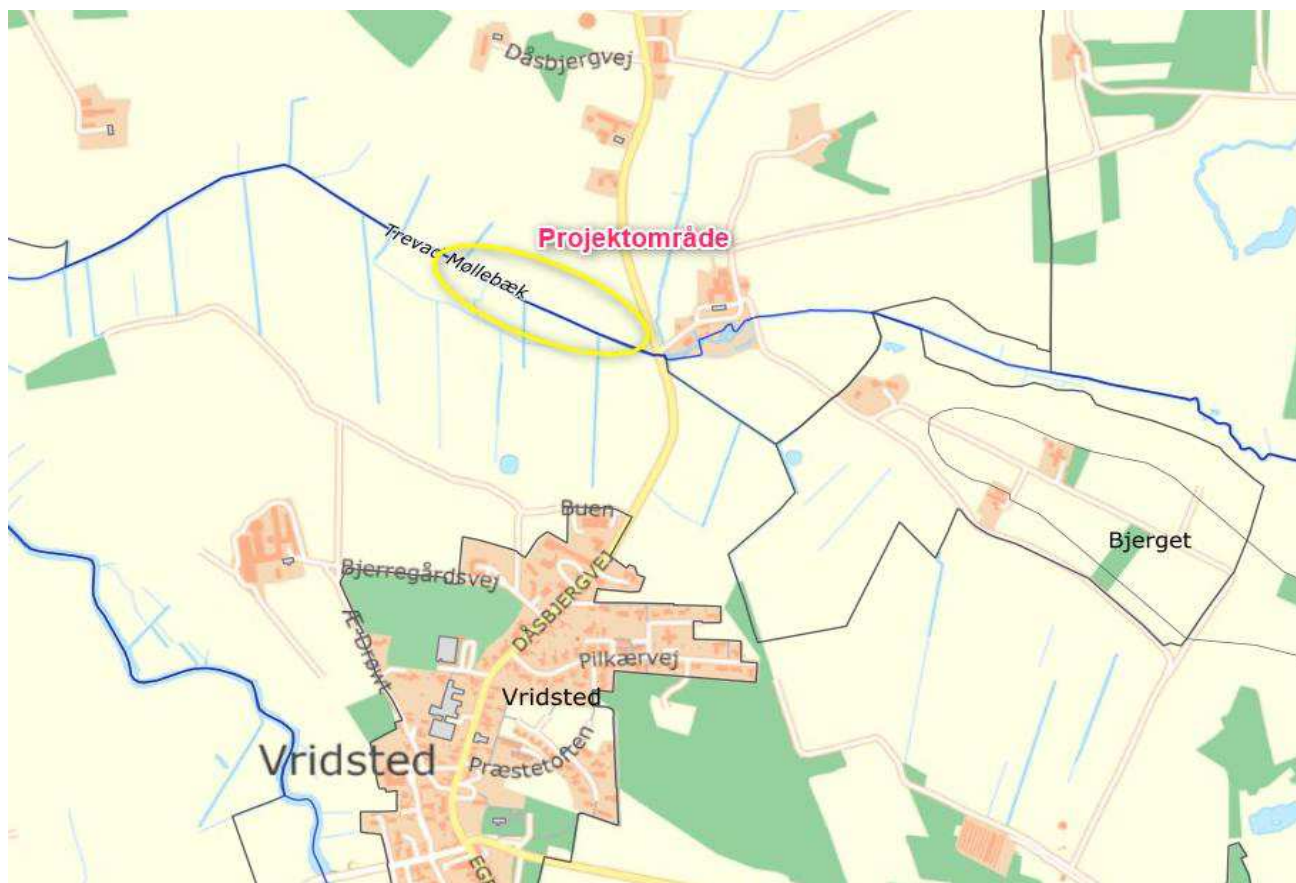

Satellit billede af området:

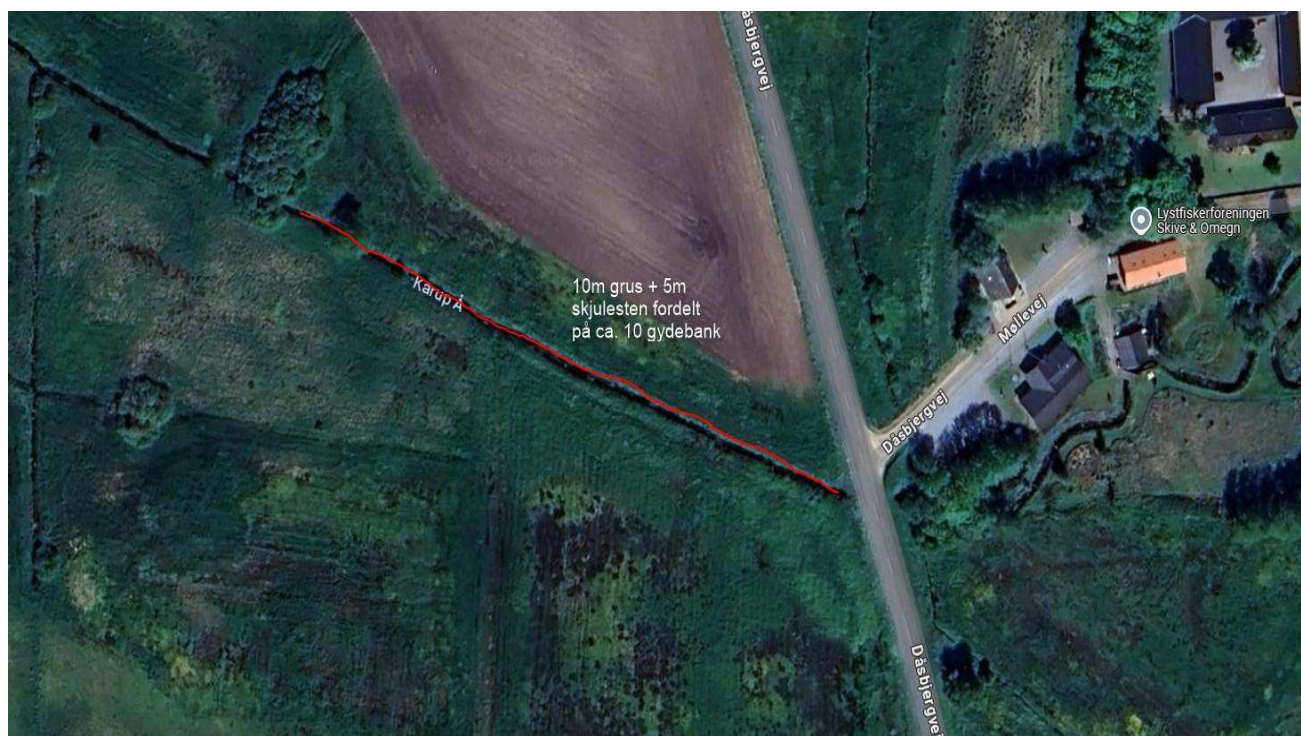

Matrikelkort over projektområdet:

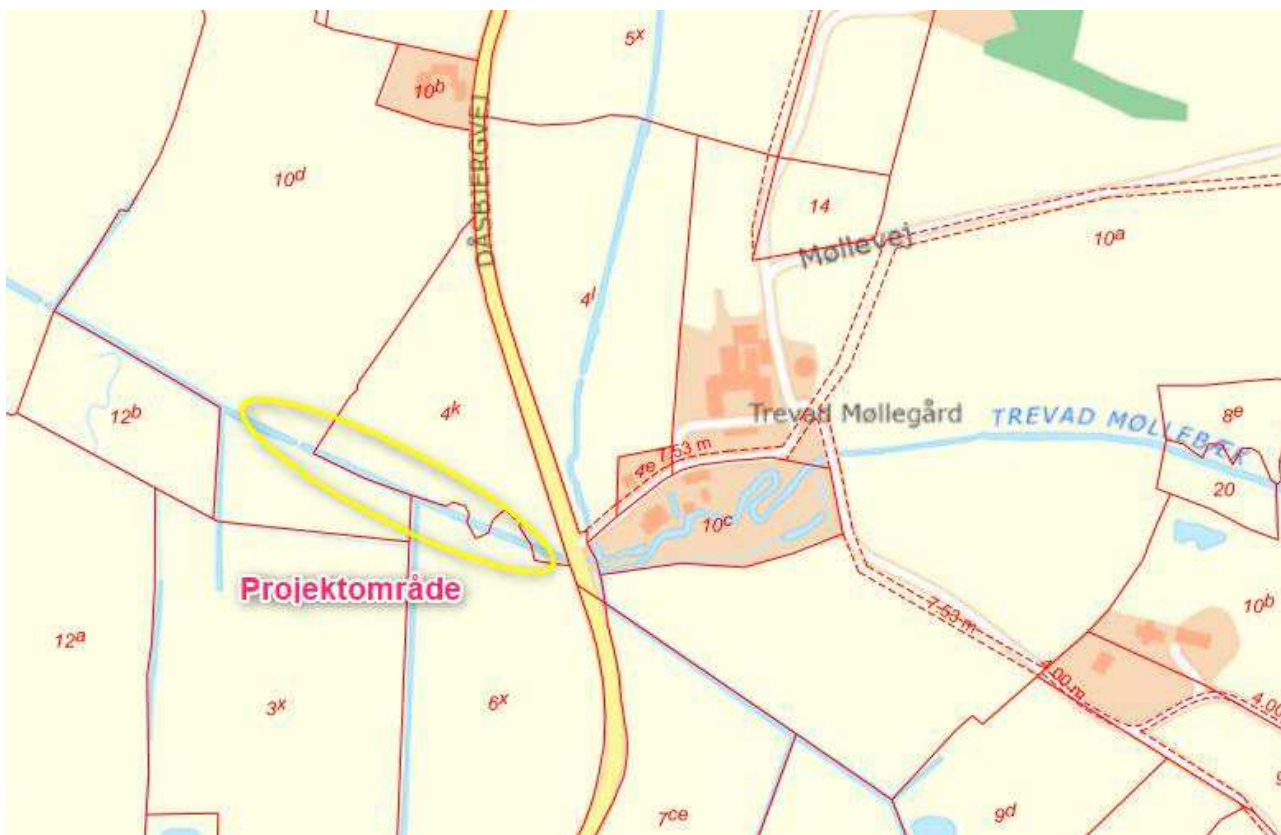

Placering af gydebanks og angivelse af tilkørselsveje :

